

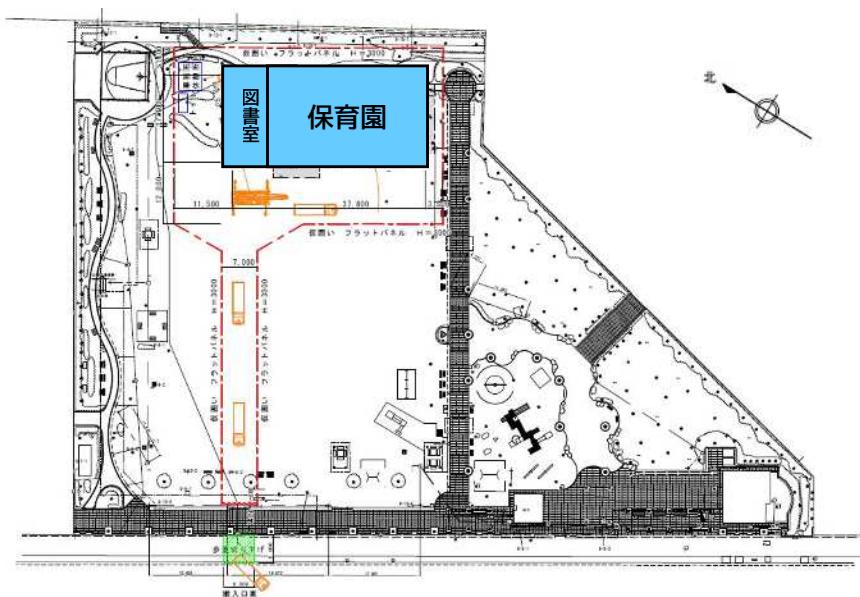
(3) 検討会における検討状況

資料No.1－2のとおり

2 仮施設の設置等について

(1) お台場レインボー公園における仮施設の位置

仮施設の設置期間中においても、公園内で自由に遊べるスペースが有効に取れること、公園利用者の利用頻度が高い遊具や東屋を継続して利用できることから、図に示した位置に設置します。



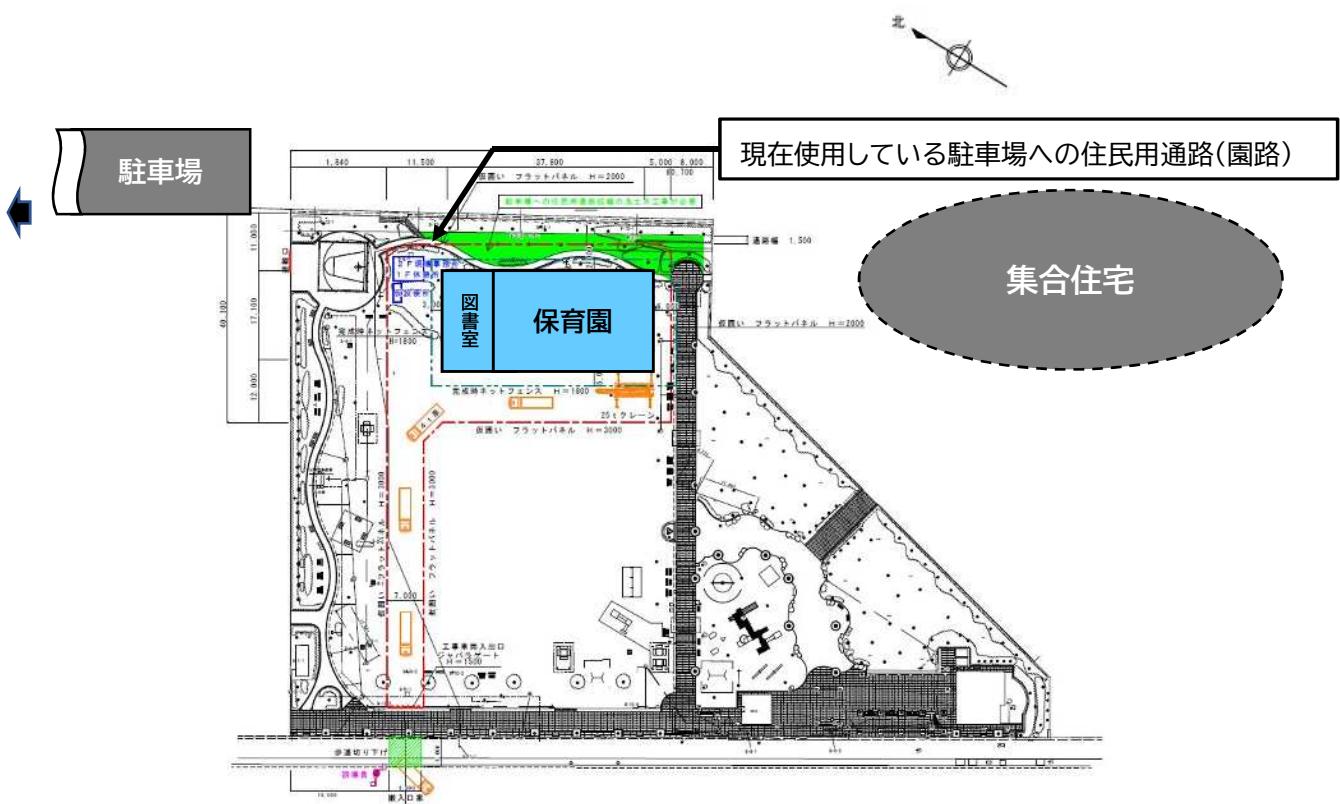
(2) 仮施設の設置に伴う影響

仮施設については、保育園登園時のベビーカーの利用を想定し、広い園路のある建物東側に保育園、西側に図書室を配置することから、図書室に図書等を搬入する経路を別に確保する必要があります。

また、仮施設の設置により、公園に隣接する集合住宅の居住者が使用している「台場レインボーブリッジ下駐車場」を利用する際の動線となっている園路が使用できなくなります。このため、公園北側の傾斜地（次ページの緑色で示した部分）を平坦に整地して、図書等の搬入や駐車場利用者が通行可能なスペースを確保します。

新たな通行スペースの確保が必要なことから、この位置での仮施設の設置は、経費の増加につながるという課題がありましたが、地域住民の意向が非常に強いことを踏まえ、当該位置に設置することとしました。

なお、仮施設の設置や撤去、原状回復を行う際は、資機材を搬入する車両の動線を確保する必要があり、その間は、一部（次ページの赤色の破線で囲った部分）が利用できなくなります。



3 事業費の概算について


(1) 仮施設の設置経費(建物リース契約)

総額約4億円(設計・設置工事、建物賃借、解体工事等に要する経費)

(2) お台場レインボー公園の賃借料

改修計画では、お台場レインボー公園の賃借料を約5千万円と想定していましたが、土地を所有する東京都港湾局と協議した結果、仮施設の設置期間中もお台場レインボー公園は閉鎖しないことなどを条件として台場保育園及び台場区民センター図書室の仮施設の設置に係る用地の貸付については、無償とする旨の承諾を得ています。

4 整備スケジュール

令和	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
台場保育園等仮施設	3年1月～ 3年3月 要求水準書作成 				
(工程)		契約の期間  3年8月～ 3年12月 設計	4年1月～ 4年7月 設置工事	4年8月～ 5年11月 仮施設運営 	5年12月～ 6年3月 解体工事 
(参考) 台場コミュニティ ぷらざ 大規模 改修工事	2年7月～ 3年3月 基本設計 	3年6月～ 4年2月 実施設計・積算 		4年7月～ 5年11月 改修工事 	5年12月～ 運営再開 

5 今後のスケジュール

令和3年 6月 令和3年第2回港区議会定例会(補正予算)

7月 契約締結(入札)

8月～仮施設整備（設計・設置工事）

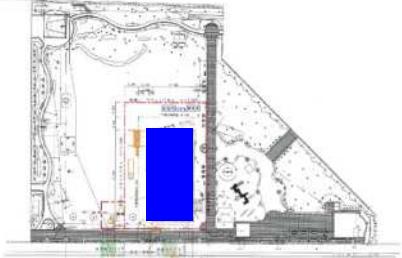
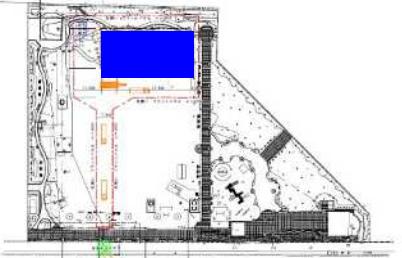
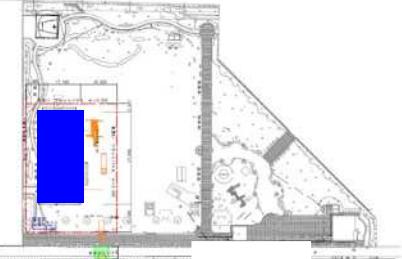
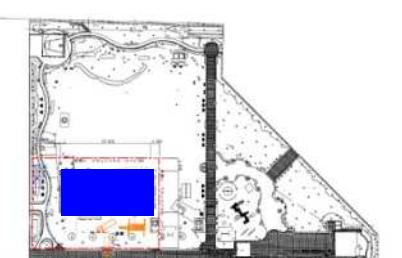
令和4年 8月 仮施設へ移転

令和5年12月 本施設へ移転

芝浦港南地区総合支所管理課

台場保育園等仮移転検討会における検討状況について

第1回検討会(令和2年9月29日)の検討状況

No.	配置図	主な意見(要旨)
案①		<ul style="list-style-type: none">遊具、東屋は利用者が多いので、無くなったら困る。園を一番利用している乳幼児のためにも遊具は撤去しないでほしい。(道路側から見たときに)子どもたちが視界から消えてしまう。 <p>【安全性に課題があることからこの案は否決されました。】</p>
案②		<ul style="list-style-type: none">案①～④の中ではこの中では一番良い。案②は工事中公園を分断してしまうため区は案③が良いと思っている。 <p>【第2回検討会で引き続き検討することとなりました。】</p>
案③		<ul style="list-style-type: none">にじのはし幼稚園の日照に影響があるのではないか。案①～④の4案しかないのか。バスケットゴールをつぶして公園の奥にもっていってはどうか。 <p>【第2回検討会で引き続き検討するとともに、この意見を踏まえて第2回検討会で案⑤、案⑥を新たに提示しました。】</p>
案④		<ul style="list-style-type: none">遊具、東屋を撤去するのは良くない避難場所であることを踏まえると防災面からみてありえない。 <p>【防災上の課題があることからこの案は否決されました。】</p>

