

区長報告第5号

港区立一の橋公園整備工事請負契約の変更について

- 1 件 名 港区立一の橋公園整備工事
- 2 契約の相手方 日比谷・かたばみ建設共同企業体
- 3 工事場所 東京都港区東麻布三丁目9番1号
- 4 変更内容
 - (1) 契約金額 (税込み)

変更前	354,200,000円
変更後	371,547,000円
増額	17,347,000円
 - (2) 工期

変更前	令和3年10月8日から令和5年3月17日まで
変更後	令和3年10月8日から令和5年6月26日まで
- 5 変更年月日 令和5年1月5日
- 6 変更理由 地中障害物の撤去等に係る追加工事による変更
- 7 増額金額等 別紙1のとおり
- 8 変更工事概要等 別紙2のとおり

増額金額等

1 増額金額内訳


項 目	金額 (円)
地盤改良工事費、地中障害物の撤去・処分費	9,038,000
盛土工事費	△1,251,000
舗装費等	1,343,000
共通費	6,640,000
小 計	15,770,000
消 費 税 額	1,577,000
合 計	17,347,000

※共通費 現場管理費、一般管理費、共通仮設費等

2 地中障害物の種類及び数量

種 類	数 量
廃プラスチック	2,975kg
コンクリートガラ	27 m ³

1 平面図

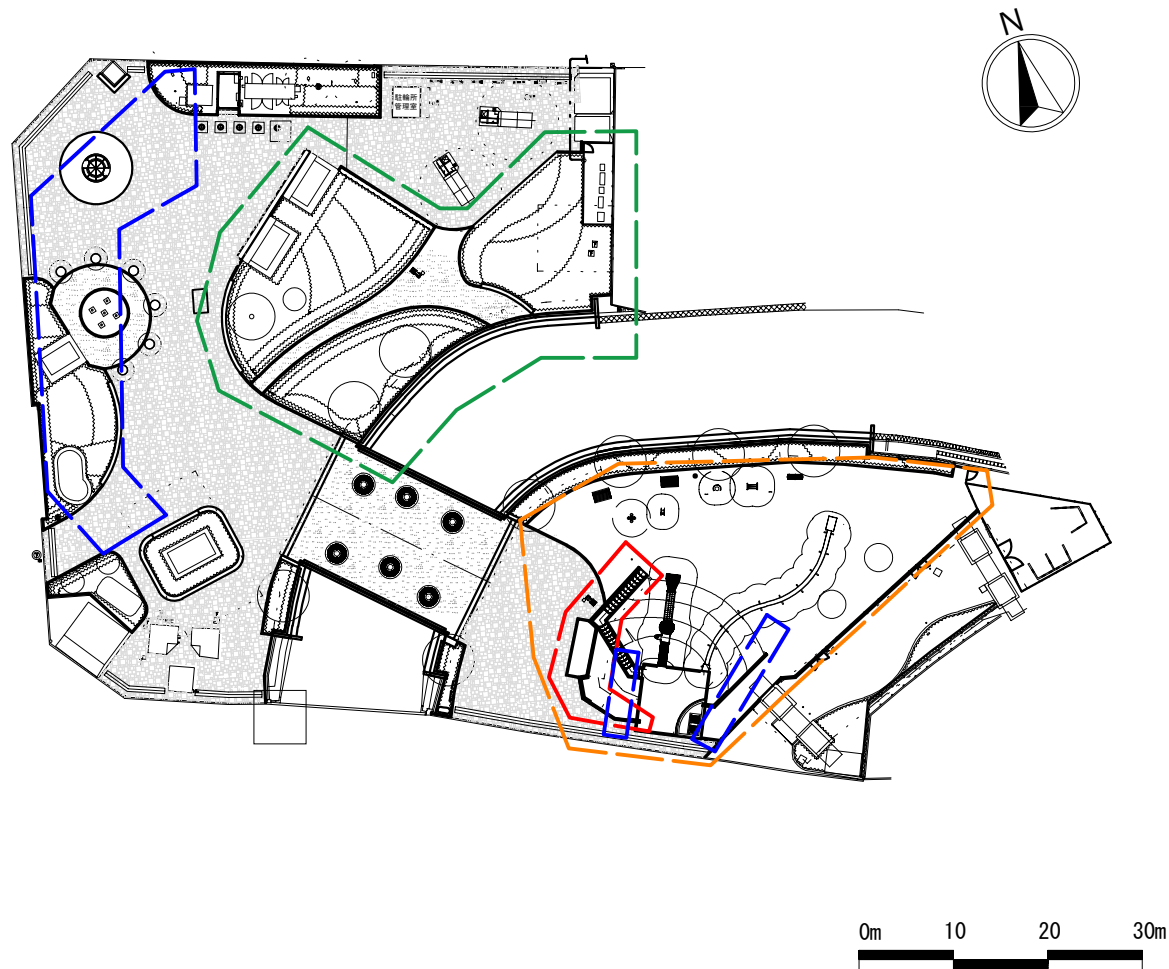

縮尺 1/800


2 変更概要

(1) 地盤改良工事

擁壁設置工事において、支持力が不足していることから、地中に柱状改良体を設置するため、セメント等注入了しました。




断面図

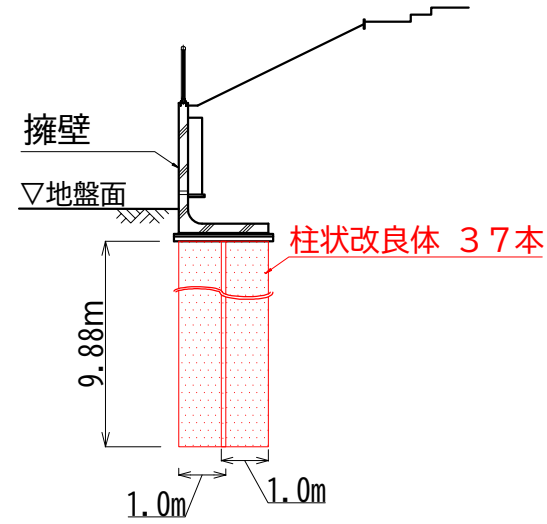

(2) 盛土工事

盛土の厚さ30cmのうち約15cm分について、建設発生土を利用し、盛土工事費を減額しました。

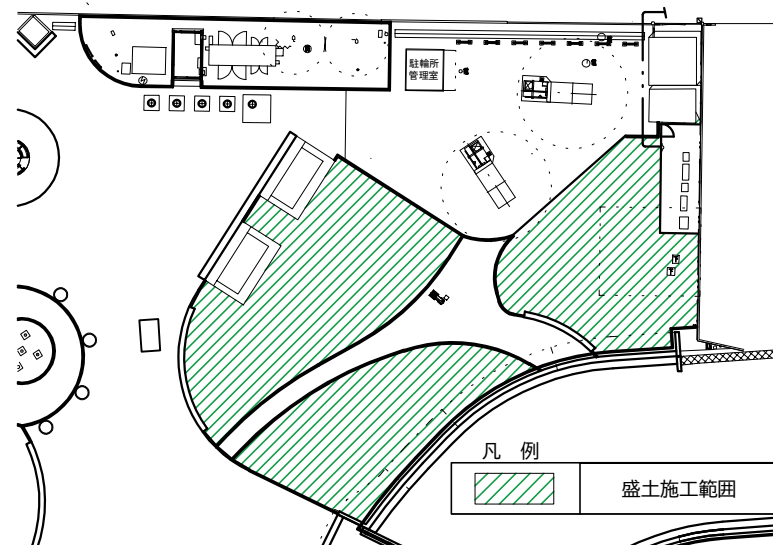

(3) 地中障害物の撤去・処分

廃プラスチック及びコンクリートガラを撤去・処分しました。



(4) 舗装工事

芝生施工範囲の一部をダスト舗装に変更しました。

