

区長報告第10号

麻布十番一・二丁目道路整備工事（Ⅱ期）請負契約の変更について

- 1 件 名 麻布十番一・二丁目道路整備工事（Ⅱ期）
- 2 契約の相手方 株式会社ランドスケープ
- 3 工事場所 東京都港区麻布十番一丁目5番先から麻布十番二丁目1番先まで
- 4 変更内容
 - (1) 契約金額（税込み）

変更前	287,812,800円
変更後	292,585,700円
増額	4,772,900円
 - (2) 工期

変更前	令和4年3月16日から令和5年9月30日まで
変更後	令和4年3月16日から令和5年11月17日まで
- 5 変更年月日 令和5年6月1日
- 6 変更理由 排水施設の構造変更等及び安全施設の追加設置による契約金額の変更並びに沿道における建築工事との調整に伴う工期の変更
- 7 増額金額等 別紙1のとおり
- 8 変更工事概要等 別紙2のとおり

増額金額等

1 増額金額内訳

項 目	金額 (円)
排水施設工費等	2,089,300
安全施設工費等	589,600
共 通 費	1,660,100
小 計	4,339,000
消 費 税 額	433,900
合 計	4,772,900

※共通費 現場管理費、一般管理費、共通仮設費等

2 排水施設の種類及び数量


種 類	数 量	
	変更前	変更後
街きよ (平坦ブロック)	363.2m	215.0m
街きよ (段差ブロック)	360.4m	508.6m
街きよ集水ます	7 か所	13 か所

3 安全施設の種類及び数量

種 類	数 量	
	変更前	変更後
車止め	96 か所	106 か所

麻布十番一・二丁目道路整備工事（Ⅱ期）

1 平面図

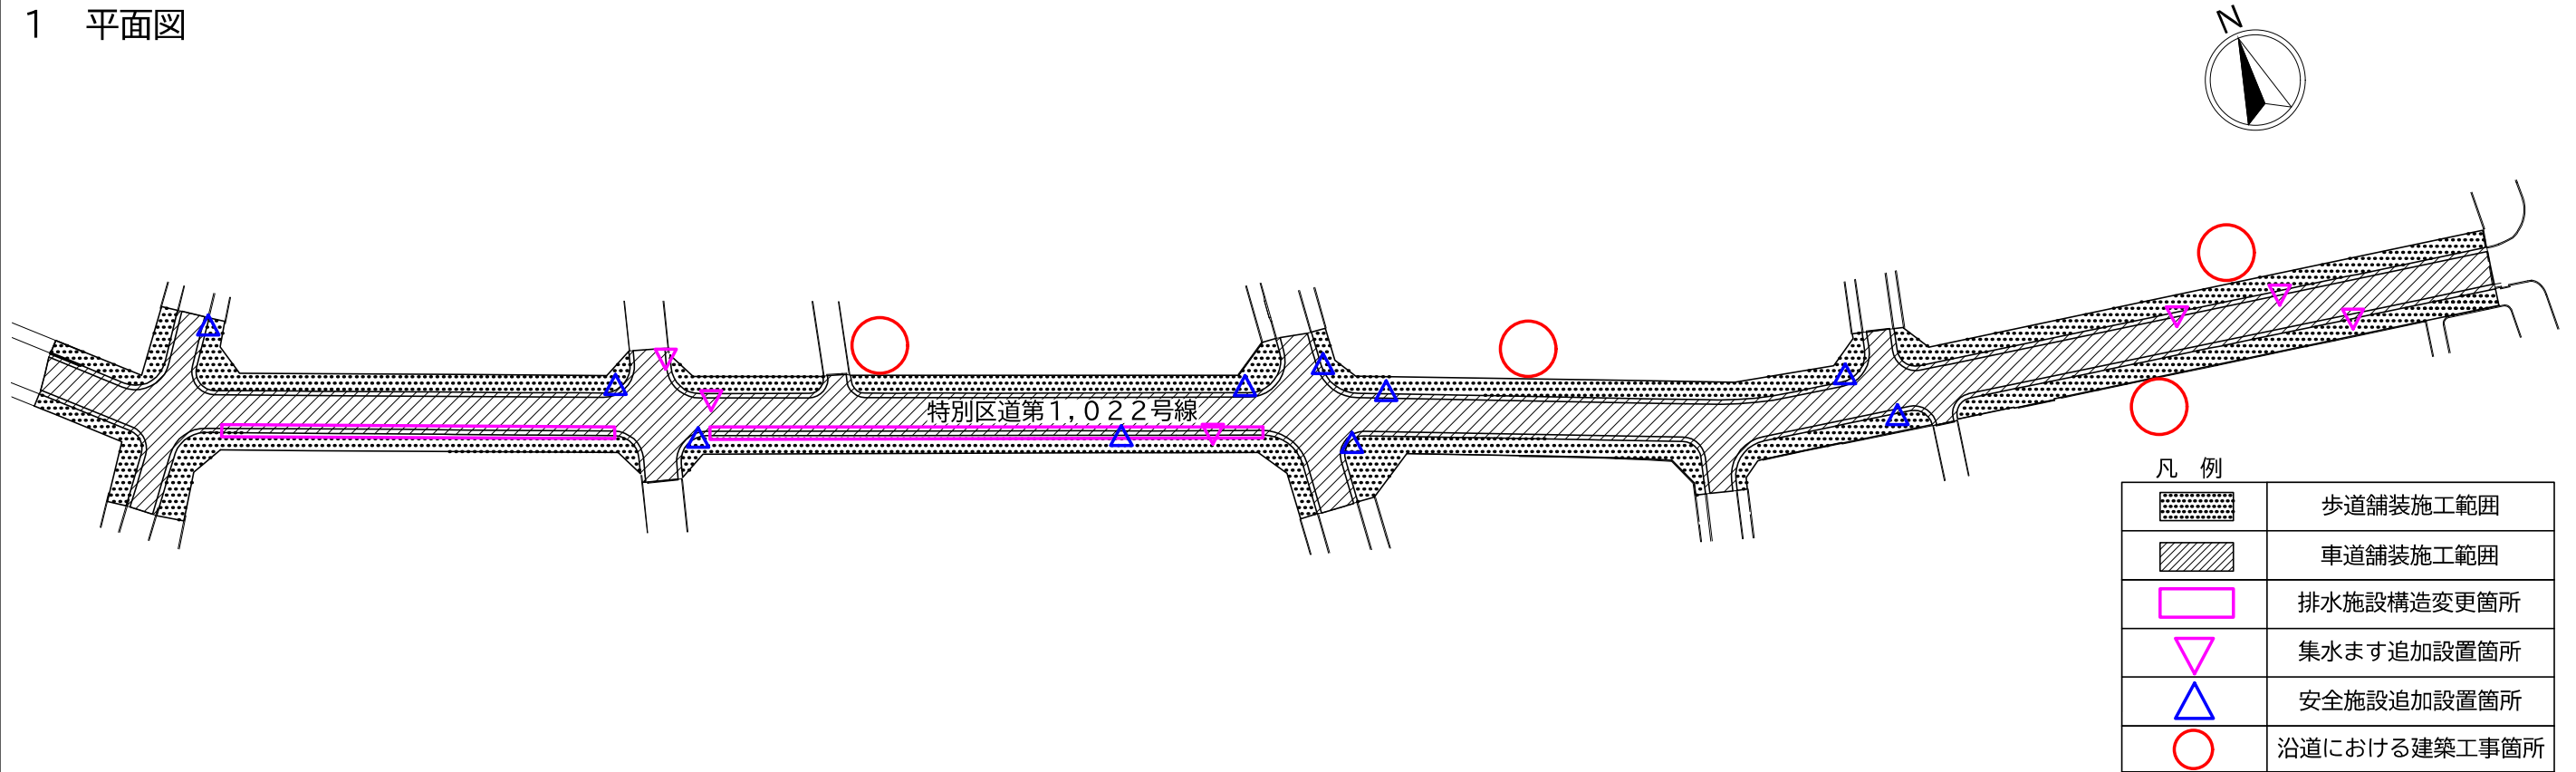


凡例	
	歩道舗装施工範囲
	車道舗装施工範囲
	排水施設構造変更箇所
	集水ます追加設置箇所
	安全施設追加設置箇所
	沿道における建築工事箇所

2 変更概要



(1) 排水施設（街きよ）の構造変更等

集中豪雨や台風時における麻布十番商店街の店舗への雨水流入を抑制するため、排水施設（街きよ）の構造を変更するとともに集水ますを追加しました。

街きよ断面図(変更前)

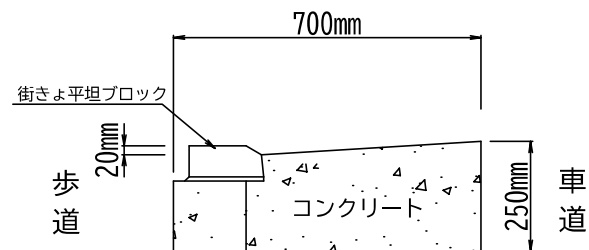


街きよ断面図(変更後)

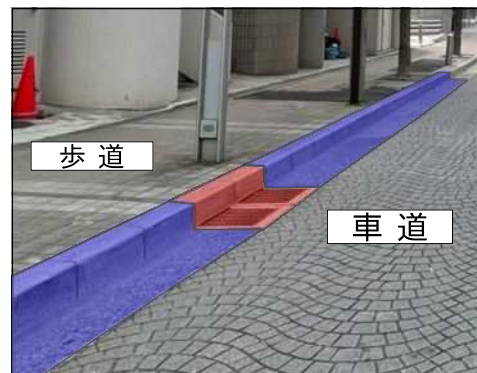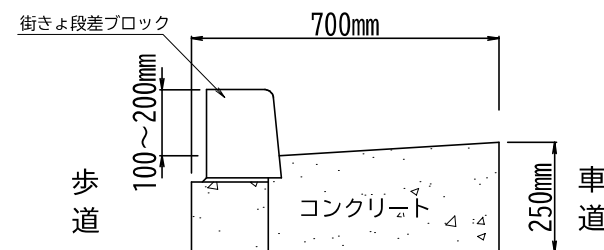

■: 街きよ ■: 集水ます
 街きよ …道路に沿って設ける排水路
 集水ます…道路の雨水等を貯留するための構造物

(2) 安全施設の設置数変更

交差点部等における歩道への車両乗入を防止するため、安全施設（車止め）を追加しました。

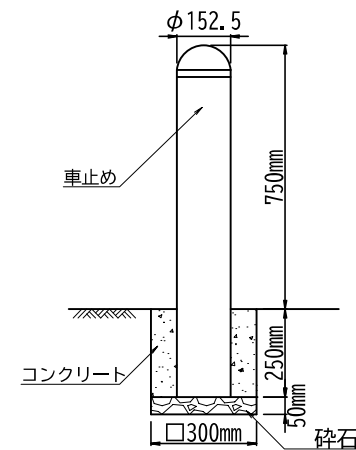

(3) 工期延伸

沿道における建築工事との作業スペースの調整により工期を延伸しました。

