

区長報告第11号

麻布十番一・二丁目道路整備工事（Ⅱ期）請負契約の変更について

- 1 件 名 麻布十番一・二丁目道路整備工事（Ⅱ期）
- 2 契約の相手方 株式会社ランドスケープ
- 3 工事場所 東京都港区麻布十番一丁目5番先から麻布十番二丁目1番先まで
- 4 工 期 令和4年3月16日から令和5年11月17日まで
- 5 変更内容
契約金額（税込み）
変更前 292,585,700円
変更後 306,517,200円
増 額 13,931,500円
- 6 変更年月日 令和5年8月18日
- 7 変更理由 舗装施工面積の変更、植樹ます設置工事の変更、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスライド条項を適用したことによる変更
- 8 増額金額等 別紙1のとおり
- 9 変更工事概要等 別紙2のとおり

増額金額等

1 増額金額内訳

項 目	金額 (円)
舗装工費等	780,670
植樹ます設置工費等	5,849,250
インフレスライド	4,734,257
共 通 費	1,300,823
小 計	12,665,000
消 費 税 額	1,266,500
合 計	13,931,500

※共通費 現場管理費、一般管理費、共通仮設費等


2 舗装施工面積の変更

種 類	数 量	
	変更前	変更後
車道	2,290 m ²	2,314 m ²
歩道	1,874 m ²	1,852 m ²

3 植樹ます設置工事の変更

種 類	数 量	
	変更前	変更後
植樹ます設置 (再利用の受枠)	37 か所	8 か所
植樹ます設置 (新規の受枠)	0 か所	29 か所

1 平面図

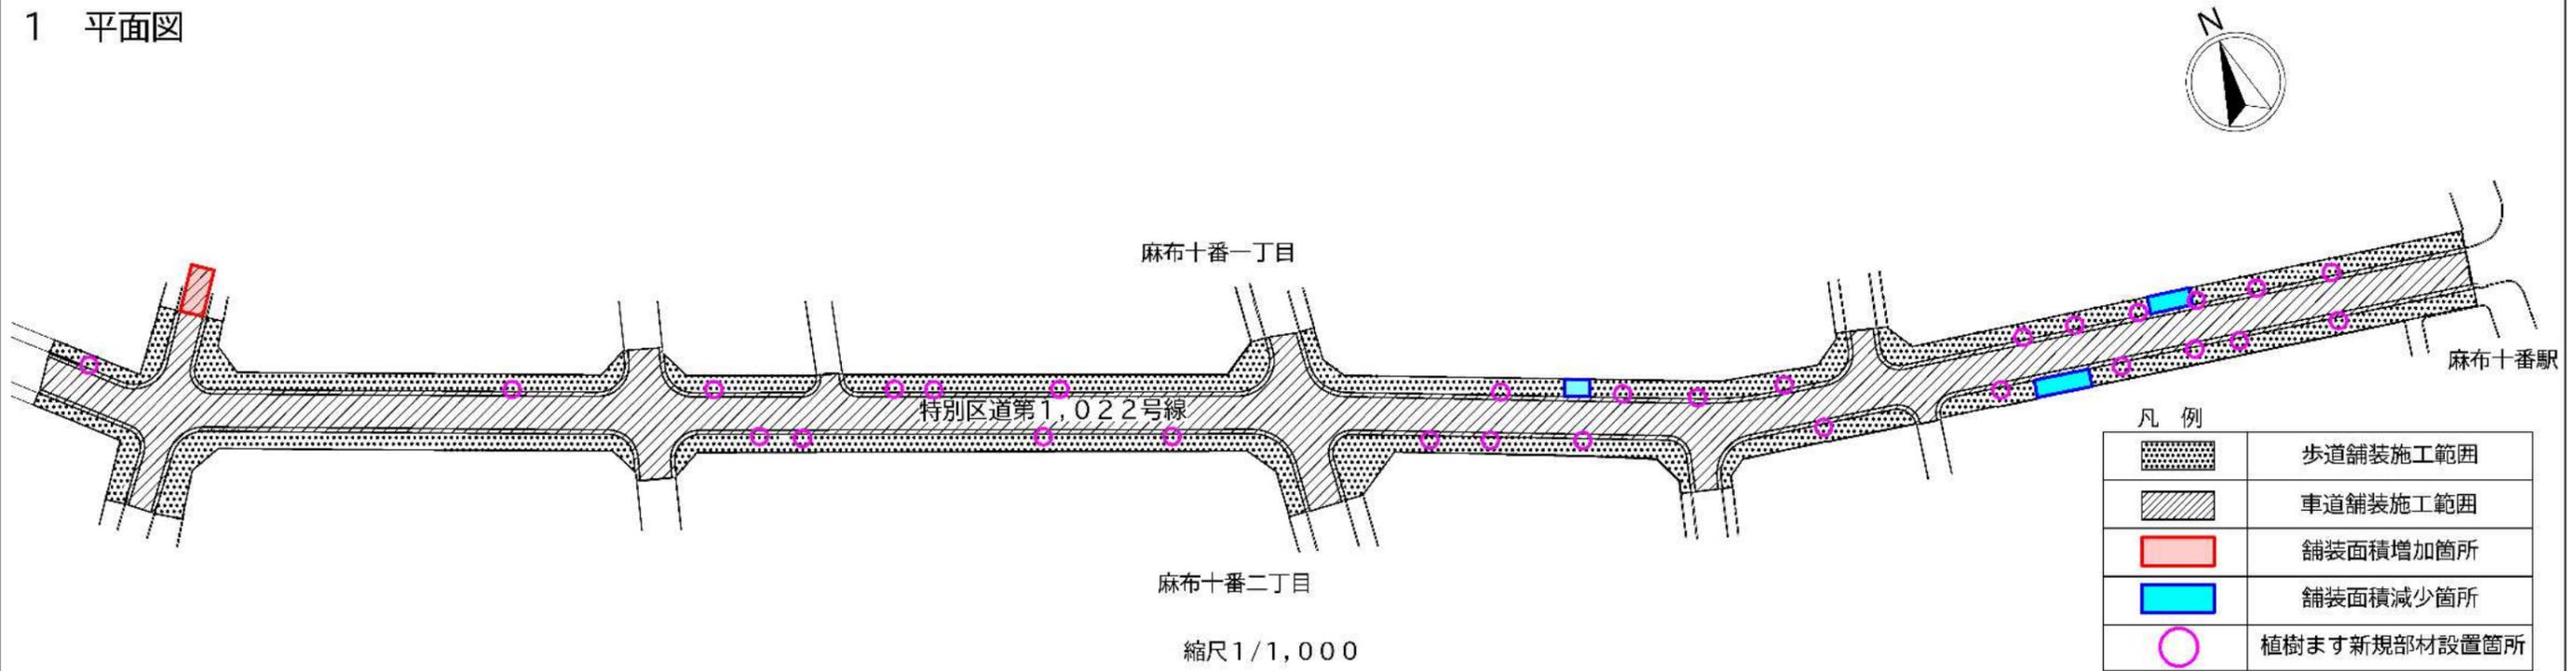

2 変更概要

(1) 車道及び歩道舗装の施工面積の変更

車道のインターロッキングブロックの劣化及び沿道の建築工事との調整のため、舗装面積を変更しました。

車道舗装(施工前)



車道舗装(施工後)



歩道舗装



(2) 植樹ます設置工事の変更

金具欠損等により、再利用できない植樹ますの受枠について、新規の受枠を設置しました。

植樹ます



植樹ます受枠(正常時)




植樹ます受枠(欠損状況)



植樹ます受枠

受枠平面図

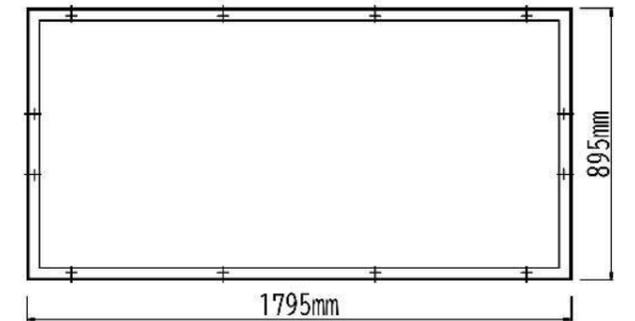

受枠側面図

